



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ДОСТУПНЫМ ЖИЛЬЕМ»

итоги за 2024 год

Ответственный исполнитель:

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ИТОГИ ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ


ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ



ДОСТИЖЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ И КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ



ОСВОЕНИЕ СРЕДСТВ (млн. рублей)

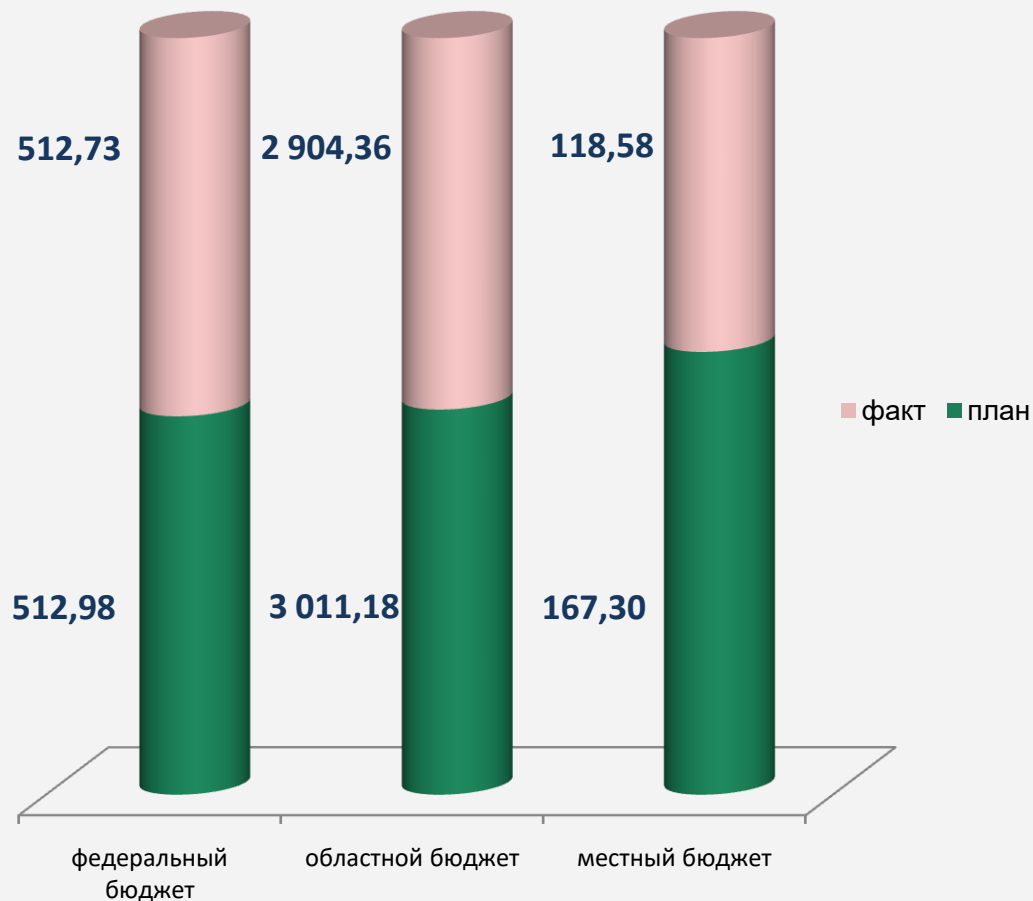

**СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2024 ГОДУ**

Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановое значение на 2024 год	Фактическое значение за 2024 год
Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда	тысяча квадратных метров	111,18	111,23
Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда	тысяча человек	6,2	6,8
Объем жилищного строительства	миллион квадратных метров	0,596	0,6222
Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	миллион квадратных метров	0,1128	0,1371

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2024 ГОДУ

Региональный проект «Развитие жилищного строительства и обеспечение граждан жильем в Кировской области»

☐ Реализовано 9 проектов по развитию территорий

☐ Завершено строительство объектов:

Строительство улично-дорожной сети жилой улицы № 7 от ул. Ивана Попова до ул. Совхоз 1, д. 17, в Ленинском районе муниципального образования «Город Киров» протяженностью 599,47 метра, ввод в эксплуатацию – 05.12.2024

Строительство улично-дорожной сети ул. Чистопрудненской в кадастровом квартале 43:40:000515 от ул. Ивана Попова до перспективной ул. Производственной в Ленинском районе муниципального образования «Город Киров» протяженностью 626 метров, ввод в эксплуатацию – 29.11.2024

Строительство улично-дорожной сети улицы № 1 в кадастровом квартале 43:40:000587 от ул. Торфяной до ул. Павла Корчагина в Первомайском районе муниципального образования «Город Киров» протяженностью 507,7 метра, ввод в эксплуатацию – 09.12.2024


☐ Проведена реконструкция участка улицы Рудницкого в микрорайоне «Южный-3» в г. Кирове с устройством ливневой и хозяйственно-бытовой канализации в границах и за границами реконструируемого участка протяженностью 540 метров, ввод в эксплуатацию – 28.12.2024

☐ Выполнены мероприятия по технологическому присоединению в жилом комплексе «ZNAK» в г. Кирове

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2023 ГОДУ

В 2024 году введено **622,2** тыс. кв. метров, в том числе
137,1 тыс. кв. метров

в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства

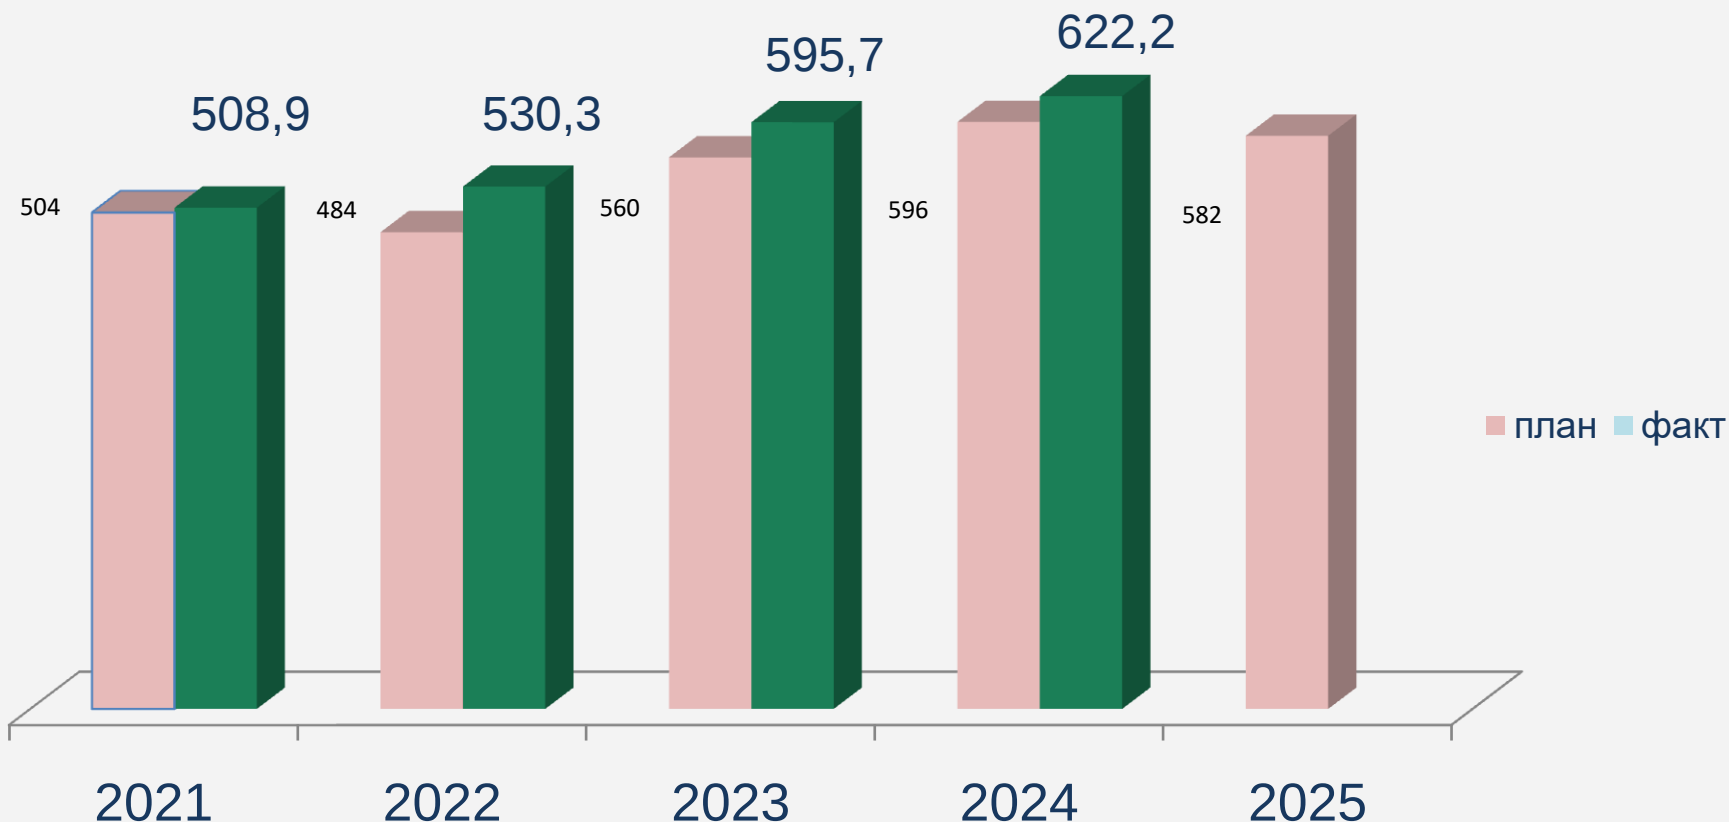

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2024 ГОДУ

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Кировской области»

Приобретено **225** жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда

Заключено **68** соглашений об изъятии у собственников жилых помещений, предусматривающих компенсационную выплату гражданам

Введены в эксплуатацию **3** многоквартирных дома

Пгт Арбаж



МКД по адресу: г. Киров, ул. Капитана Дорофеева, д.16



МКД по адресу: г. Киров, ул. Энтузиастов, д. 54

Переселено **1544** человека из аварийных жилых помещений общей площадью **22,2** тыс. кв. метров

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2024 ГОДУ

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для строительной отрасли»

- ❑ Подготовлены сведения о границах **702** населенных пунктов, утвержденные генеральными планами или схемами территориального планирования, и сведения о **519** территориальных зонах, утвержденные правилами землепользования и застройки
- ❑ Обеспечено техническое сопровождение государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Кировской области для **45** муниципальных образований
- ❑ Осуществлялся региональный государственный строительный надзор в отношении **232** объектов капитального строительства. Было проведено **332** внеплановых выездных проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц
- ❑ Осуществлялся региональный государственный контроль (надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости: проведено **1 614** мероприятий
- ❑ УНО «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства Кировской области» подписано соглашение «О передаче имущества (в т.ч. имущественных прав), обязательств перед гражданами участниками строительства, прав и обязанностей Фонда субъекта Российской Федерации по договорам (контрактам), заключенным в соответствии с целями Закона об участии в долевом строительстве». **3** объекта переданы в ППК «Фонд развития территорий» в 2024 году
- ❑ Осуществлялся региональный государственный контроль (надзор) за деятельностью жилищно-строительного кооператива, связанной с привлечением средств членов кооператива для строительства многоквартирного дома: проведено **6** контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с застройщиком
- ❑ Оказаны услуги по технической поддержке информационной системы «Информационная система управления проектами государственного заказчика в сфере строительства» **45** муниципальным образованиям

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2024 ГОДУ

Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и молодых семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий»

381 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получили жилые помещения, приобретенные за счет средств федерального и областного бюджета

Проведено **5** семинаров-совещаний с органами местного самоуправления муниципальных образований по вопросам приобретения жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

85 молодых семей Кировской области обеспечены жильем из средств федерального, регионального и местных бюджетов

5 молодых семей (100% заявившихся) – участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей в случае рождения (усыновления) одного ребенка, получили дополнительную социальную выплату

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ В 2024 ГОДУ

Комплекс процессных мероприятий «Предоставление мер государственной поддержки отдельным категориям граждан»

- ❑ Предоставлена мера социальной поддержки за счет средств федерального бюджета **8** ветеранам боевых действий
- ❑ Государственная поддержка в улучшении жилищных условий инвалидов оказана **32** семьям
- ❑ Оплачено **8** государственных жилищных сертификатов жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувшим место постоянного проживания и прибывшим в экстренном порядке на территорию Кировской области на постоянное место жительства
